ID		WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecesso	Resource Names
1		**1**	**Проект**	**104 days?**	**Wed 3/11/26**	**Mon 8/31/26**		
2	✓	**1.1**	**Концептуальный дизайн**	**16 days**	Wed 3/11/26	Wed 4/1/26		
3	✓	1.1.1	Анализ ТЗ	1.2 wks	Wed 3/11/26	Wed 3/18/26		*
4	✓	1.1.2	Выбор полетного задания	1 wk	Thu 3/19/26	Wed 3/25/26	3	*
5	✓	1.1.3	Выбор/обоснование аэродинамической схемы	1 wk	Thu 3/19/26	Wed 3/25/26	3	Данил
6	✓	1.1.4	Выбор бортового оборудования	1 wk	Thu 3/26/26	Wed 4/1/26	4	рина,Дмитрий,Роман
7	✓	1.1.5	Выбор ПО	1 wk	Thu 3/26/26	Wed 4/1/26	4	рина,Дмитрий,Роман
8	✓	1.1.6	Эскиз (3D модель)	1 wk	Thu 3/26/26	Wed 4/1/26	5	Данил
9	✓	1.1.7	Описание методологии проектирования	2.2 wks	Wed 3/18/26	Wed 4/1/26		*
10	✓	1.1.8	Сделать общее фото)	0 days	Wed 4/1/26	Wed 4/1/26		*
11		**1.2**	**Проектный дизайн**	**38.5 days**	Wed 3/25/26	**Wed 5/20/26**		
12		**1.2.1**	**Аэродинамика**	**2 wks**	**Thu 3/26/26**	**Wed 4/8/26**		
13	✓	1.2.1.1	Выбор аэрод-х профилей	2 wks	**Thu 3/26/26**	**Wed 4/8/26**	5	Данил
14	✓	1.2.1.2	Геометрические хара-ки	2 wks	**Thu 3/26/26**	**Wed 4/8/26**	5	Данил
15	✓	1.2.1.3	Аэродина-е коэфф.	2 wks	**Thu 3/26/26**	**Wed 4/8/26**	5	Данил
16		1.2.1.4	Динамическая и статическая устойчивости	2 wks	**Thu 3/26/26**	**Wed 4/8/26**	5	Данил
17	✓	**1.2.2**	**Силовая установка**	**2.5 wks?**	**Thu 4/9/26**	**Sat 4/25/26**	**12**	
18	✓	1.2.2.1	Расчет энергопотребления	2 days	**Thu 4/9/26**	Fri 4/10/26	4	Данил,Марина
19	✓	1.2.2.2	Выбор мотора и винта	7 days	**Mon 4/13/26**	Tue 4/21/26	18	Данил
20	✓	1.2.2.3	Оценка потребной и располагаемой тяг	3 days	Wed 4/22/26	**Fri 4/24/26**	19,12	Данил
21	✓	1.2.2.4	Выбор аккумулятора	1 day	Thu 4/9/26	Thu 4/9/26		
22		**1.2.3**	**Бортовое оборудование**	**15 days?**	**Thu 4/2/26**	**Wed 4/22/26**		
23	✓	1.2.3.1	Сруктурно-функциональная и схема подключения	5 days	Thu 4/2/26	Wed 4/8/26	6	Марина
24		1.2.3.2	Исследовать возможности автопилота: полная настройка автопилота +	3 wks	Thu 4/2/26	Wed 4/22/26	6	Марина
25	✓	1.2.3.3	LUA scripts. Получение навигационных параметров	3 days	Thu 4/9/26	Mon 4/13/26	23	Марина
26		1.2.3.4	LUA scripts. Обработка данных по UART	3 days	Tue 4/14/26	Thu 4/16/26	6,25	Марина
27		1.2.3.5	Интеграция телеметрического канала					
28		1.2.3.6	Сопряжение пульта и передатчика					
29		1.2.3.7	Интеграция FPV-системы					
30	✓	1.2.3.8	Расчет энергопотребления: отчет (таблица)	3 days	Fri 4/17/26	Tue 4/21/26	23	Марина
31		**1.2.4**	**Технология производства**	**23 days**	**Wed 4/1/26**	**Mon 5/4/26**		

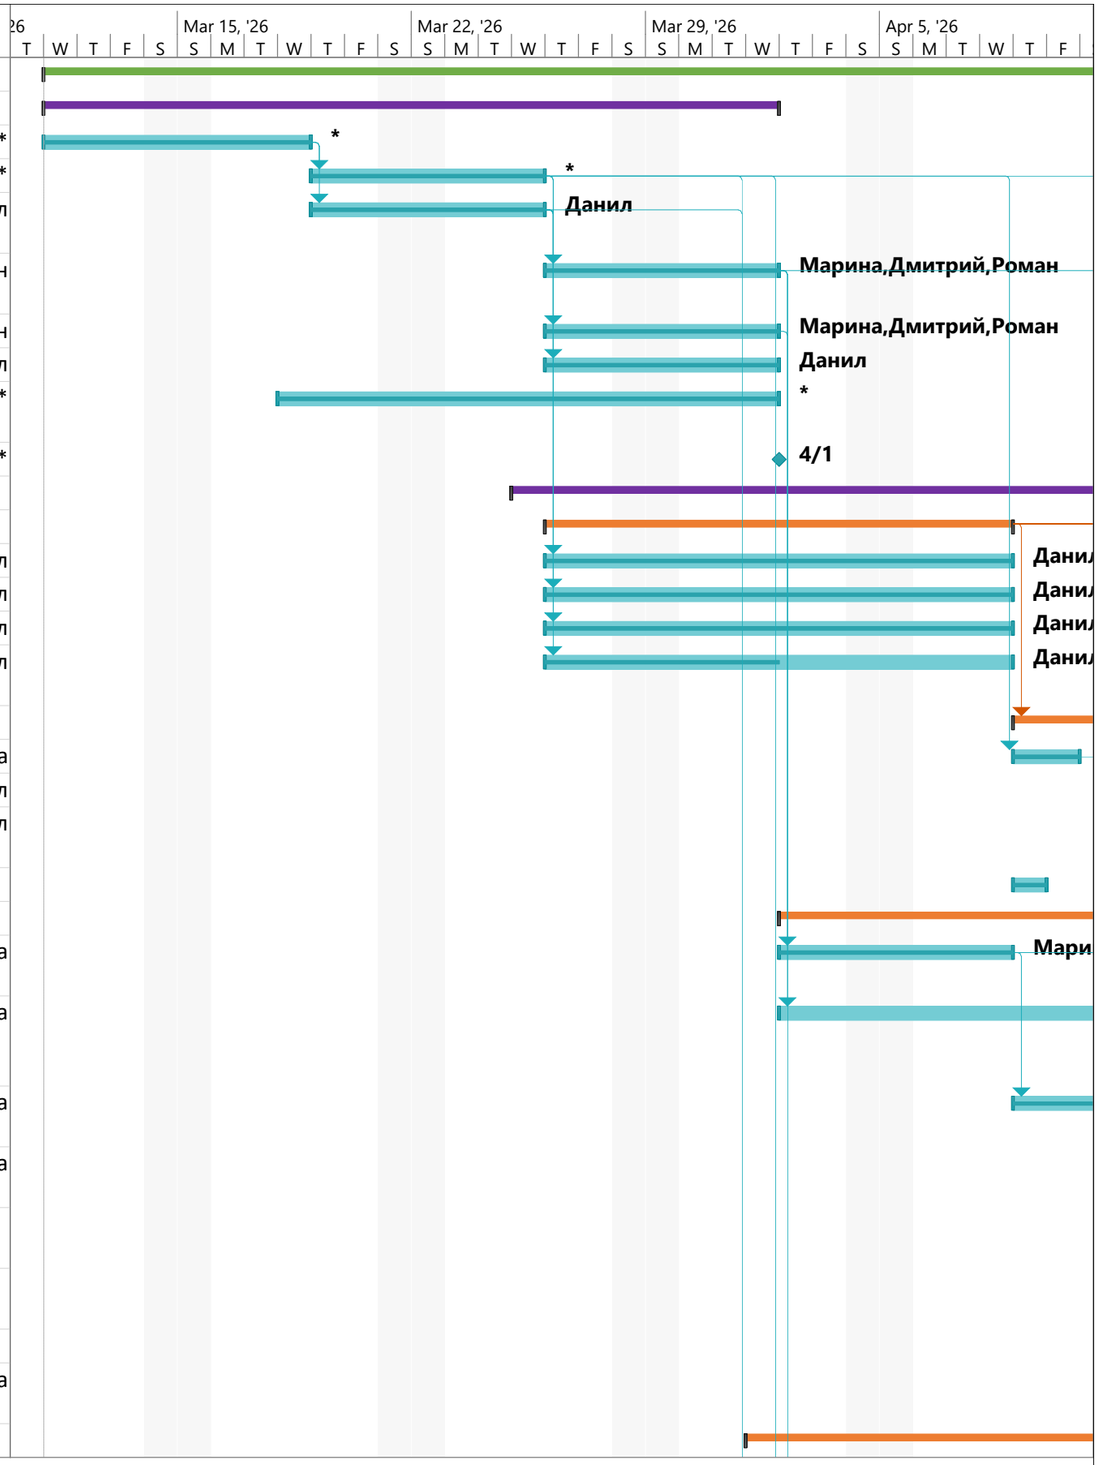

Project: Project1
Date: Fri 5/15/26

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

ID		WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecesso	Resource Names
32	✓	1.2.4.1	Выбор материалов конструкци	5 days	Wed 4/1/26	Tue 4/7/26	4,5	Роман
33	✓	1.2.4.2	Определить набор типовых элементов	7 days	Wed 4/8/26	Thu 4/16/26	32	Роман
34		1.2.4.3	Подготовить композитную матрицу	7 days	Mon 5/18/26	Fri 6/19/26	33,12,44	Данил
35		**1.2.5**	**Прочностные расчеты**	**15.5 days**	**Sat 4/25/26**	**Tue 5/19/26**		
36	✓	1.2.5.1	Оценка эксплуатационных и предельных перегрузок	3 days	Wed 4/22/26	Fri 4/24/26	4,19	Дмитрий
37	✓	1.2.5.2	V-n диаграмма	6 days	Wed 4/29/26	Thu 5/7/26	36	Данил
38		1.2.5.3	Центровочная ведомость	6 days	Fri 5/8/26	Mon 5/18/26	17,31	Дмитрий
39		**1.2.6**	**Компьютерное зрение**	**5 wks**	**Wed 3/25/26**	**Tue 4/28/26**		
40	✓	1.2.6.1	Создать базу сжатых изображений символов	5 days	Wed 3/25/26	Tue 3/31/26		Роман
41		1.2.6.2	Работа с записью данных на SI	5 days	Mon 3/30/26	Fri 4/3/26		Роман
42		1.2.6.3	Алгоритмы анализа и обработки изображений	3 wks	Wed 3/25/26	**Tue 4/14/26**		Роман
43		1.2.6.4	Прием и обработка данных по UART	5 days	Wed 4/15/26	Tue 4/21/26		Роман
44		1.2.7	Детализированная 3D модель	21 days	Thu 4/30/26	**Thu 6/25/26**		
45		**1.2.8**	**Система контроля груза**	**25 days**	**Thu 4/2/26**	**Thu 5/7/26**		
46		1.2.8.1	Баллистический калькулятор	2 wks	Thu 4/2/26	Wed 4/15/26	4,6,7	Дмитрий
47		1.2.8.2	Разработка и проектирование конструкции сброса	3 wks	Thu 4/16/26	Thu 5/7/26	12,46	Дмитрий
48		1.2.8.3	Проектирование и расчет динамики груза					Дмитрий
49		**1.3**	**Производство**	**23 days**	**Fri 5/15/26**	**Fri 7/10/26**		
50		1.3.1	Изготовление фюзеляжа	3 wks	Fri 5/15/26	Tue 6/30/26	12,31,44	Данил
51		1.3.2	Резка крыла	2 wks	Tue 5/5/26	Tue 5/19/26	12,31	Данил
52		1.3.3	Изготовление хвостового оперения	2 wks	Fri 5/15/26	Tue 6/23/26	12,31	Данил
53		1.3.4	Макетирования работы бортового оборудования	2 wks	Thu 5/14/26	Mon 6/22/26	22,39	Марина,Дмитрий
54		1.3.5	Проектирование транспортировочной коробки	1 wk	Wed 7/1/26	Tue 7/7/26	44,50,51	Роман
55		1.3.6	Натурные испытания на прочность элементов	15 days	Mon 6/15/26	Fri 7/3/26	34,36	Дмитрий
56		1.3.7	Тренировка в симуляторе	0 days	Fri 7/10/26	Fri 7/10/26		Дмитрий,Марина
57		1.4	Испытания	0 days	Wed 7/15/26	Wed 7/15/26		*

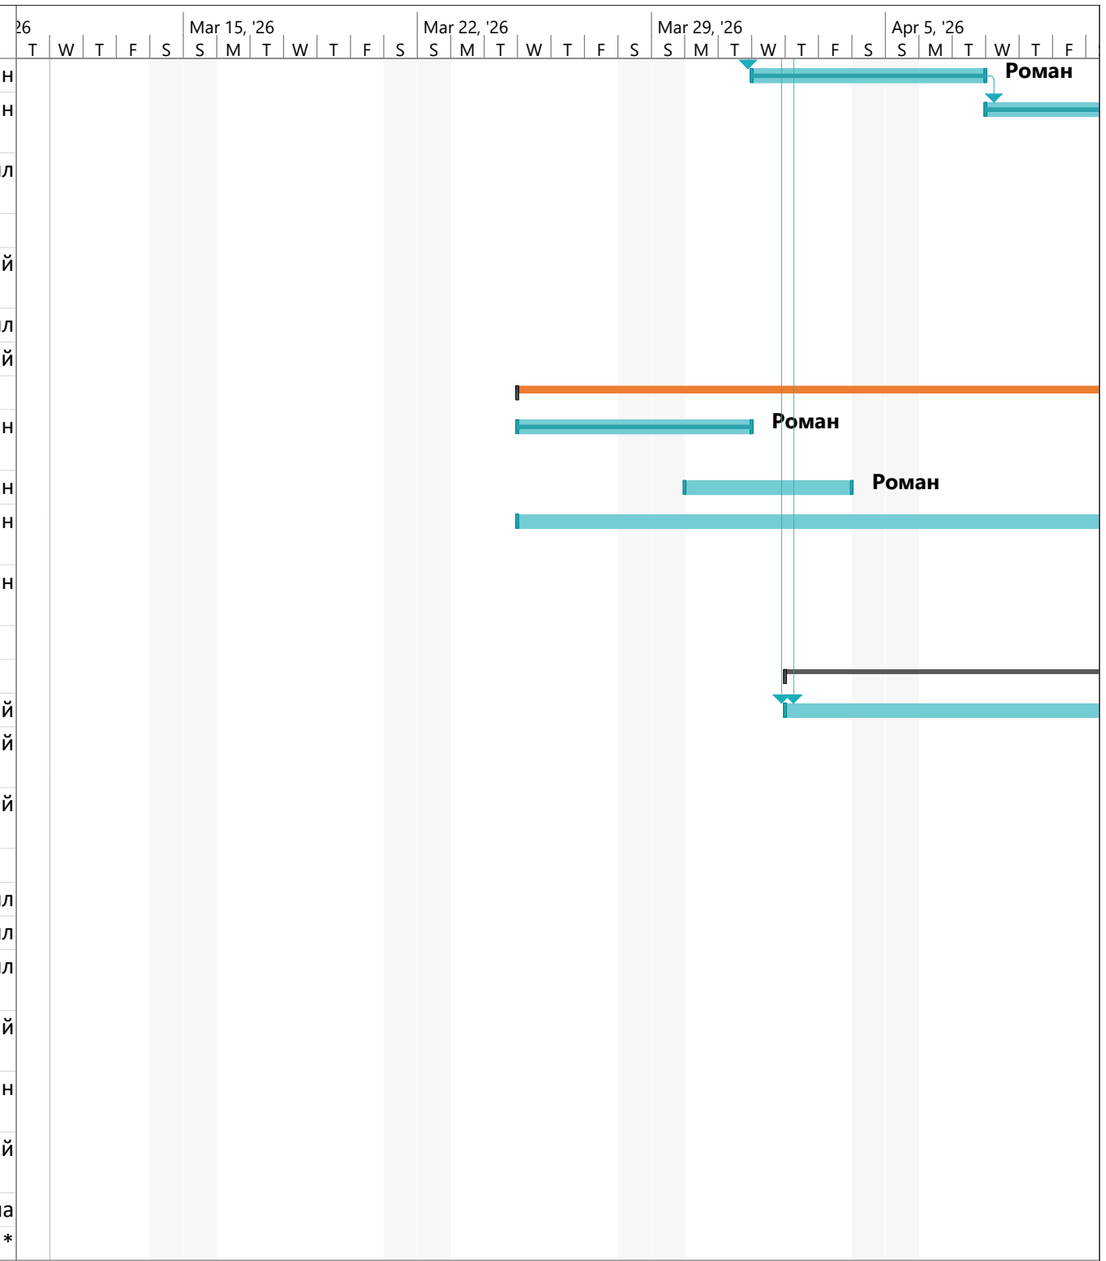

Project: Project1
Date: Fri 5/15/26

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

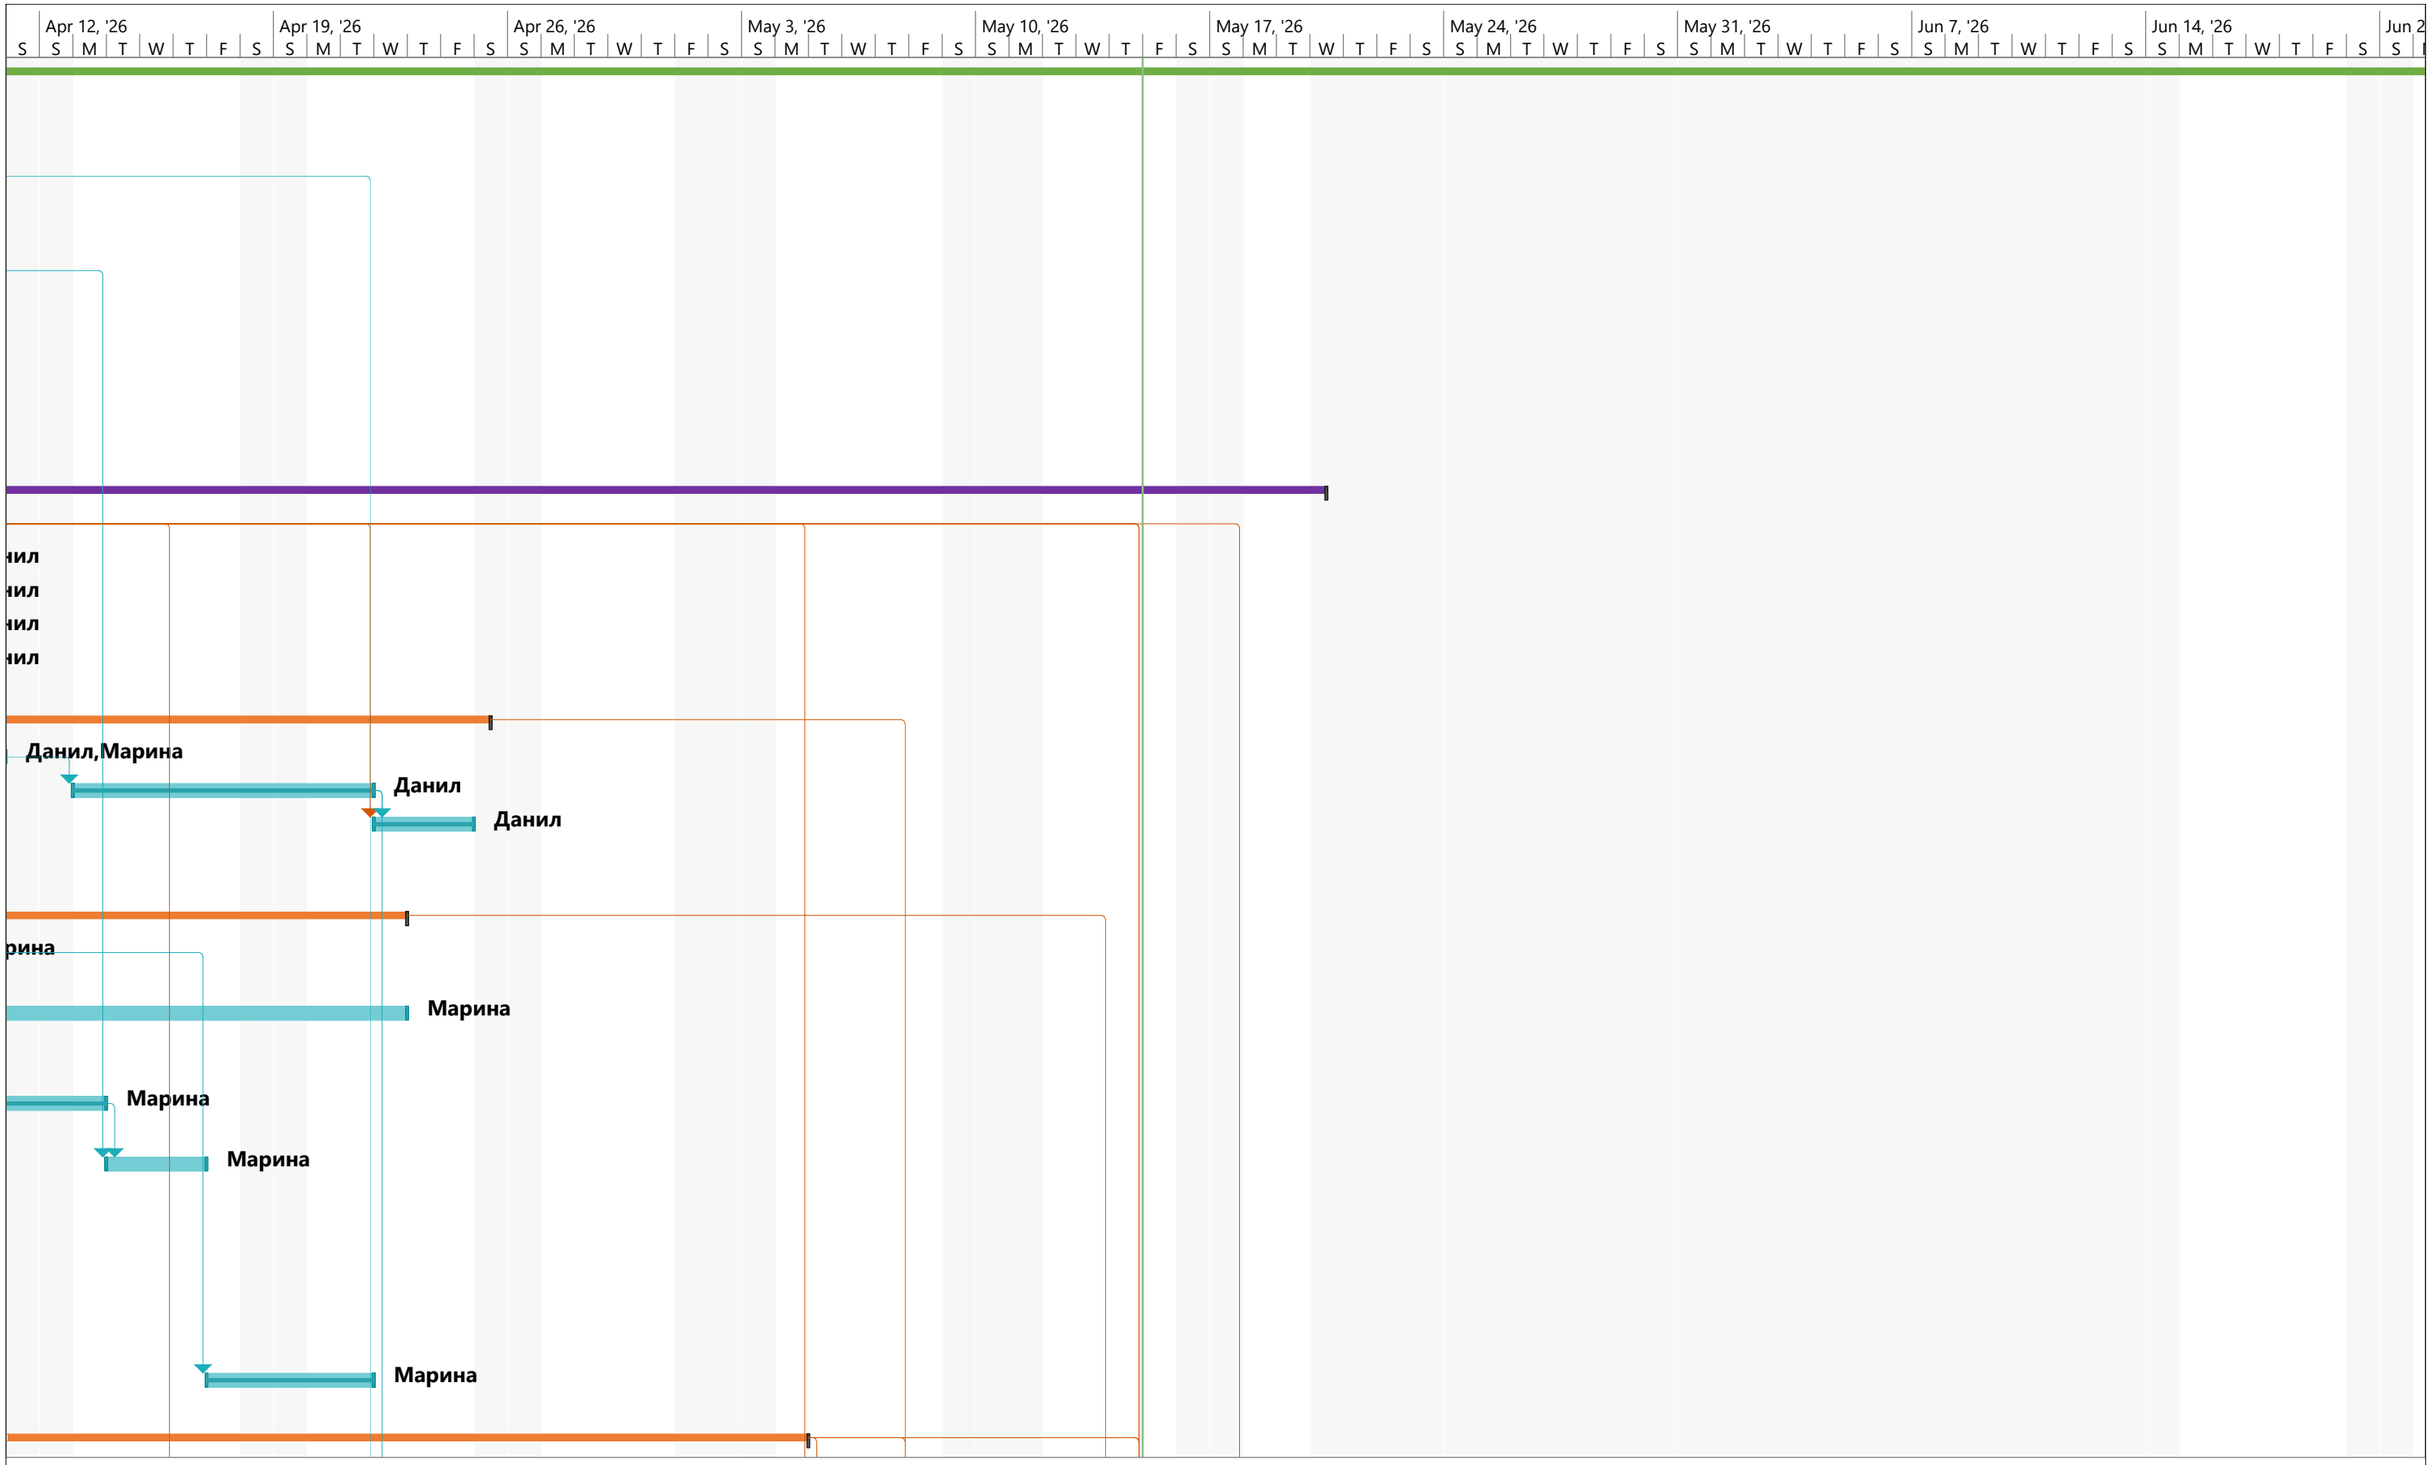

Project: Project1
Date: Fri 5/15/26

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

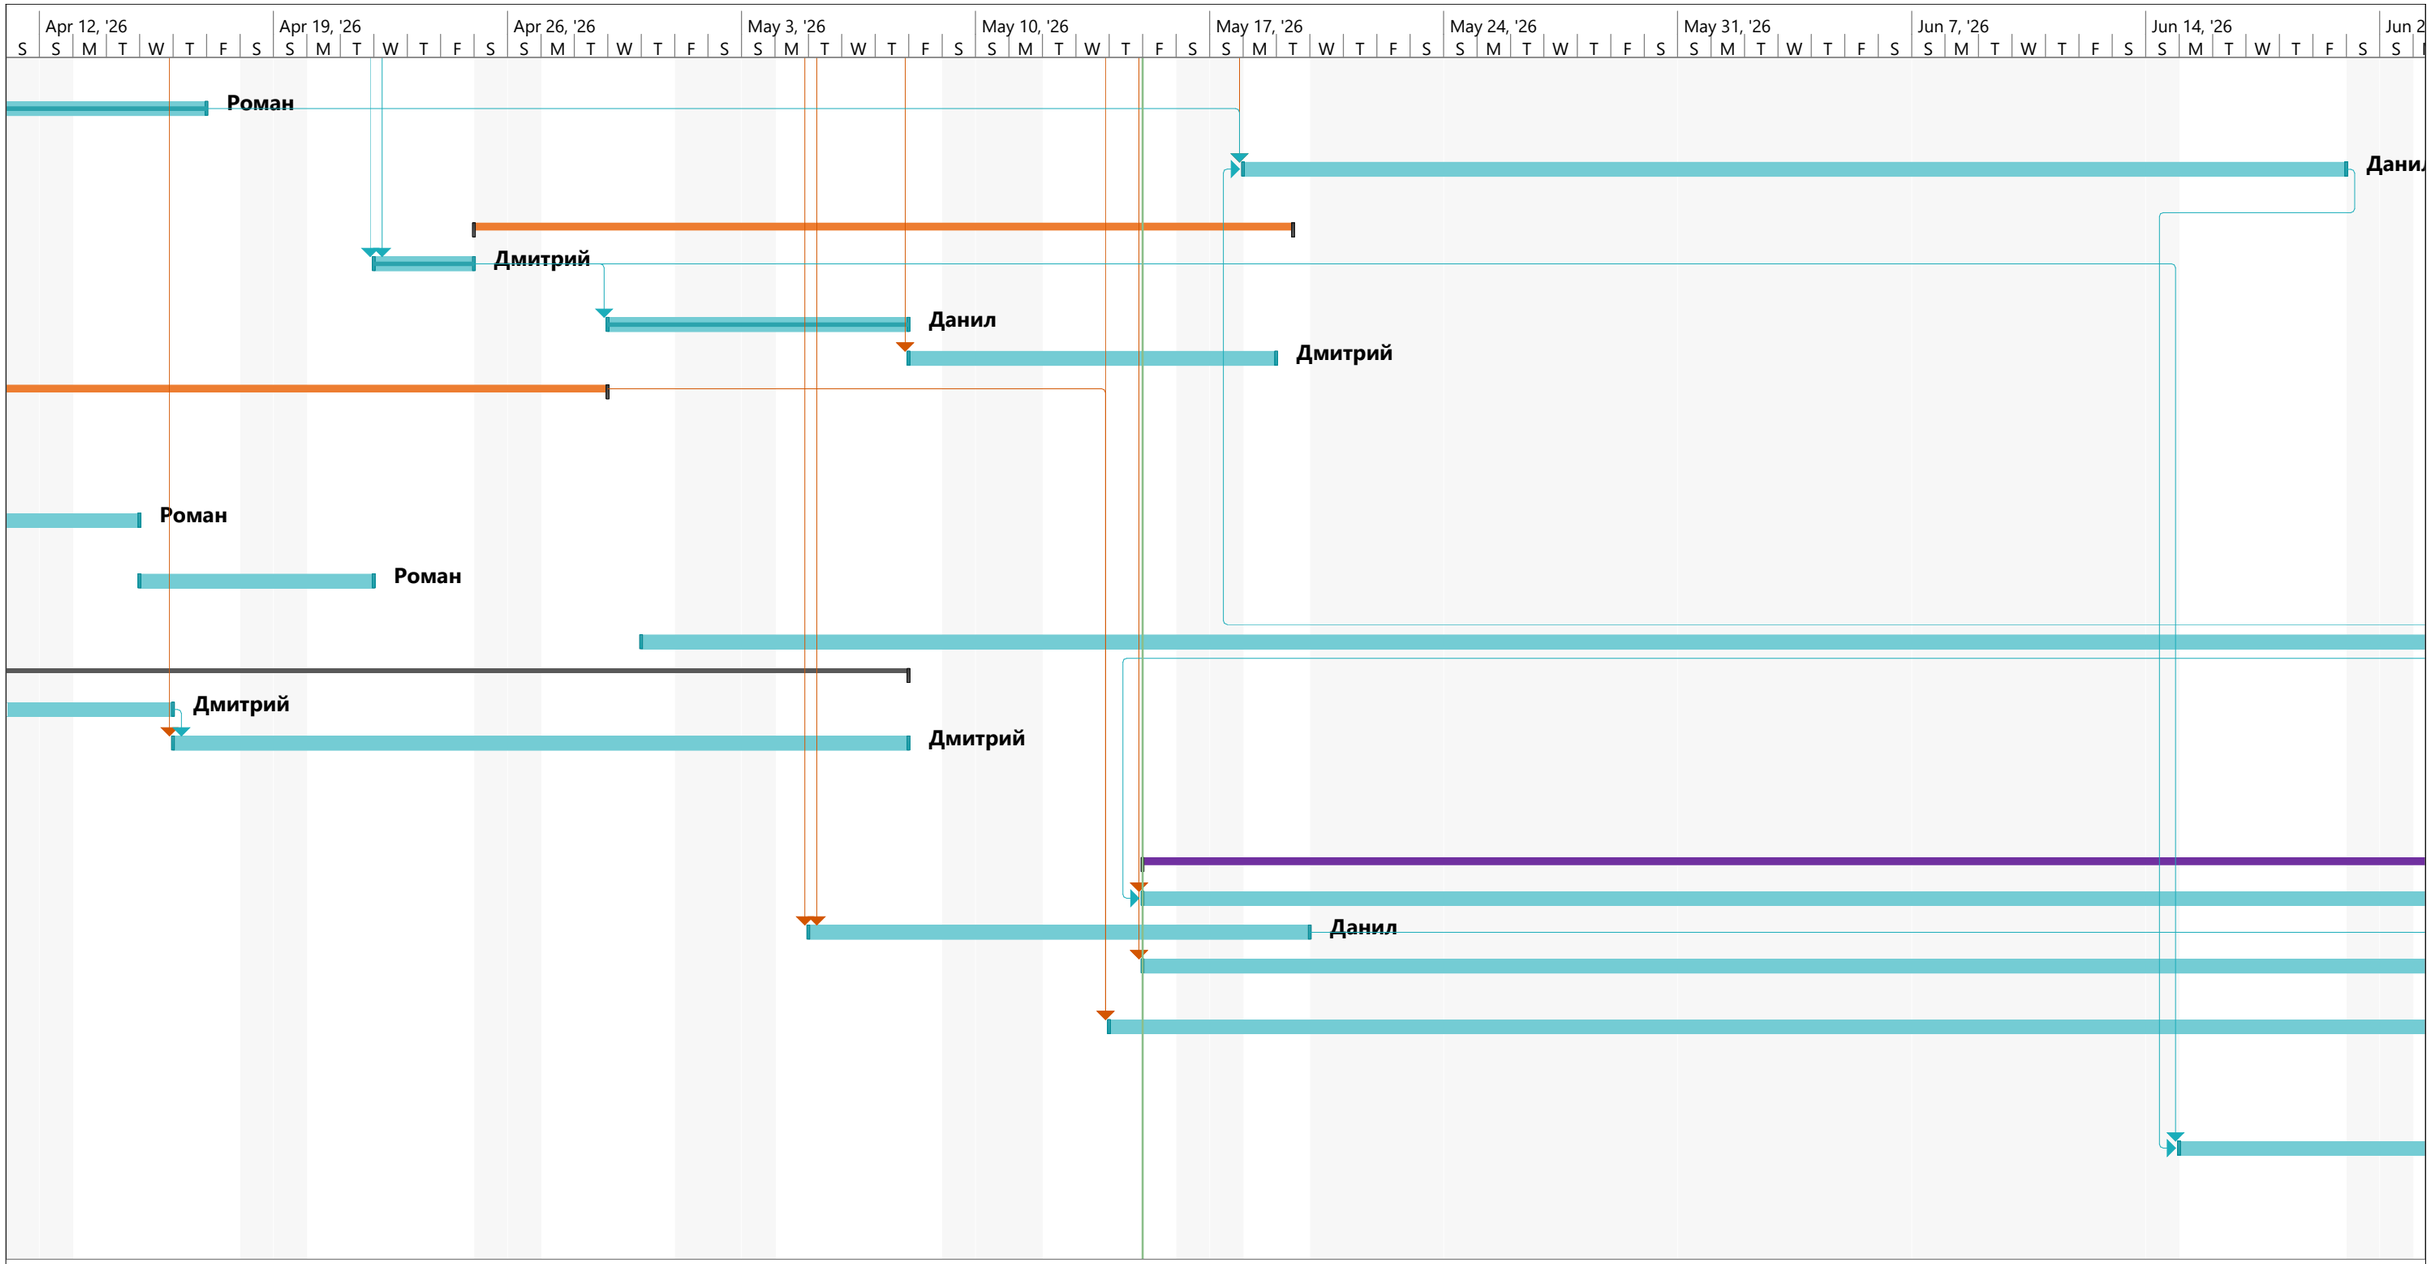

Project: Project1
Date: Fri 5/15/26

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Project: Project1
Date: Fri 5/15/26

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

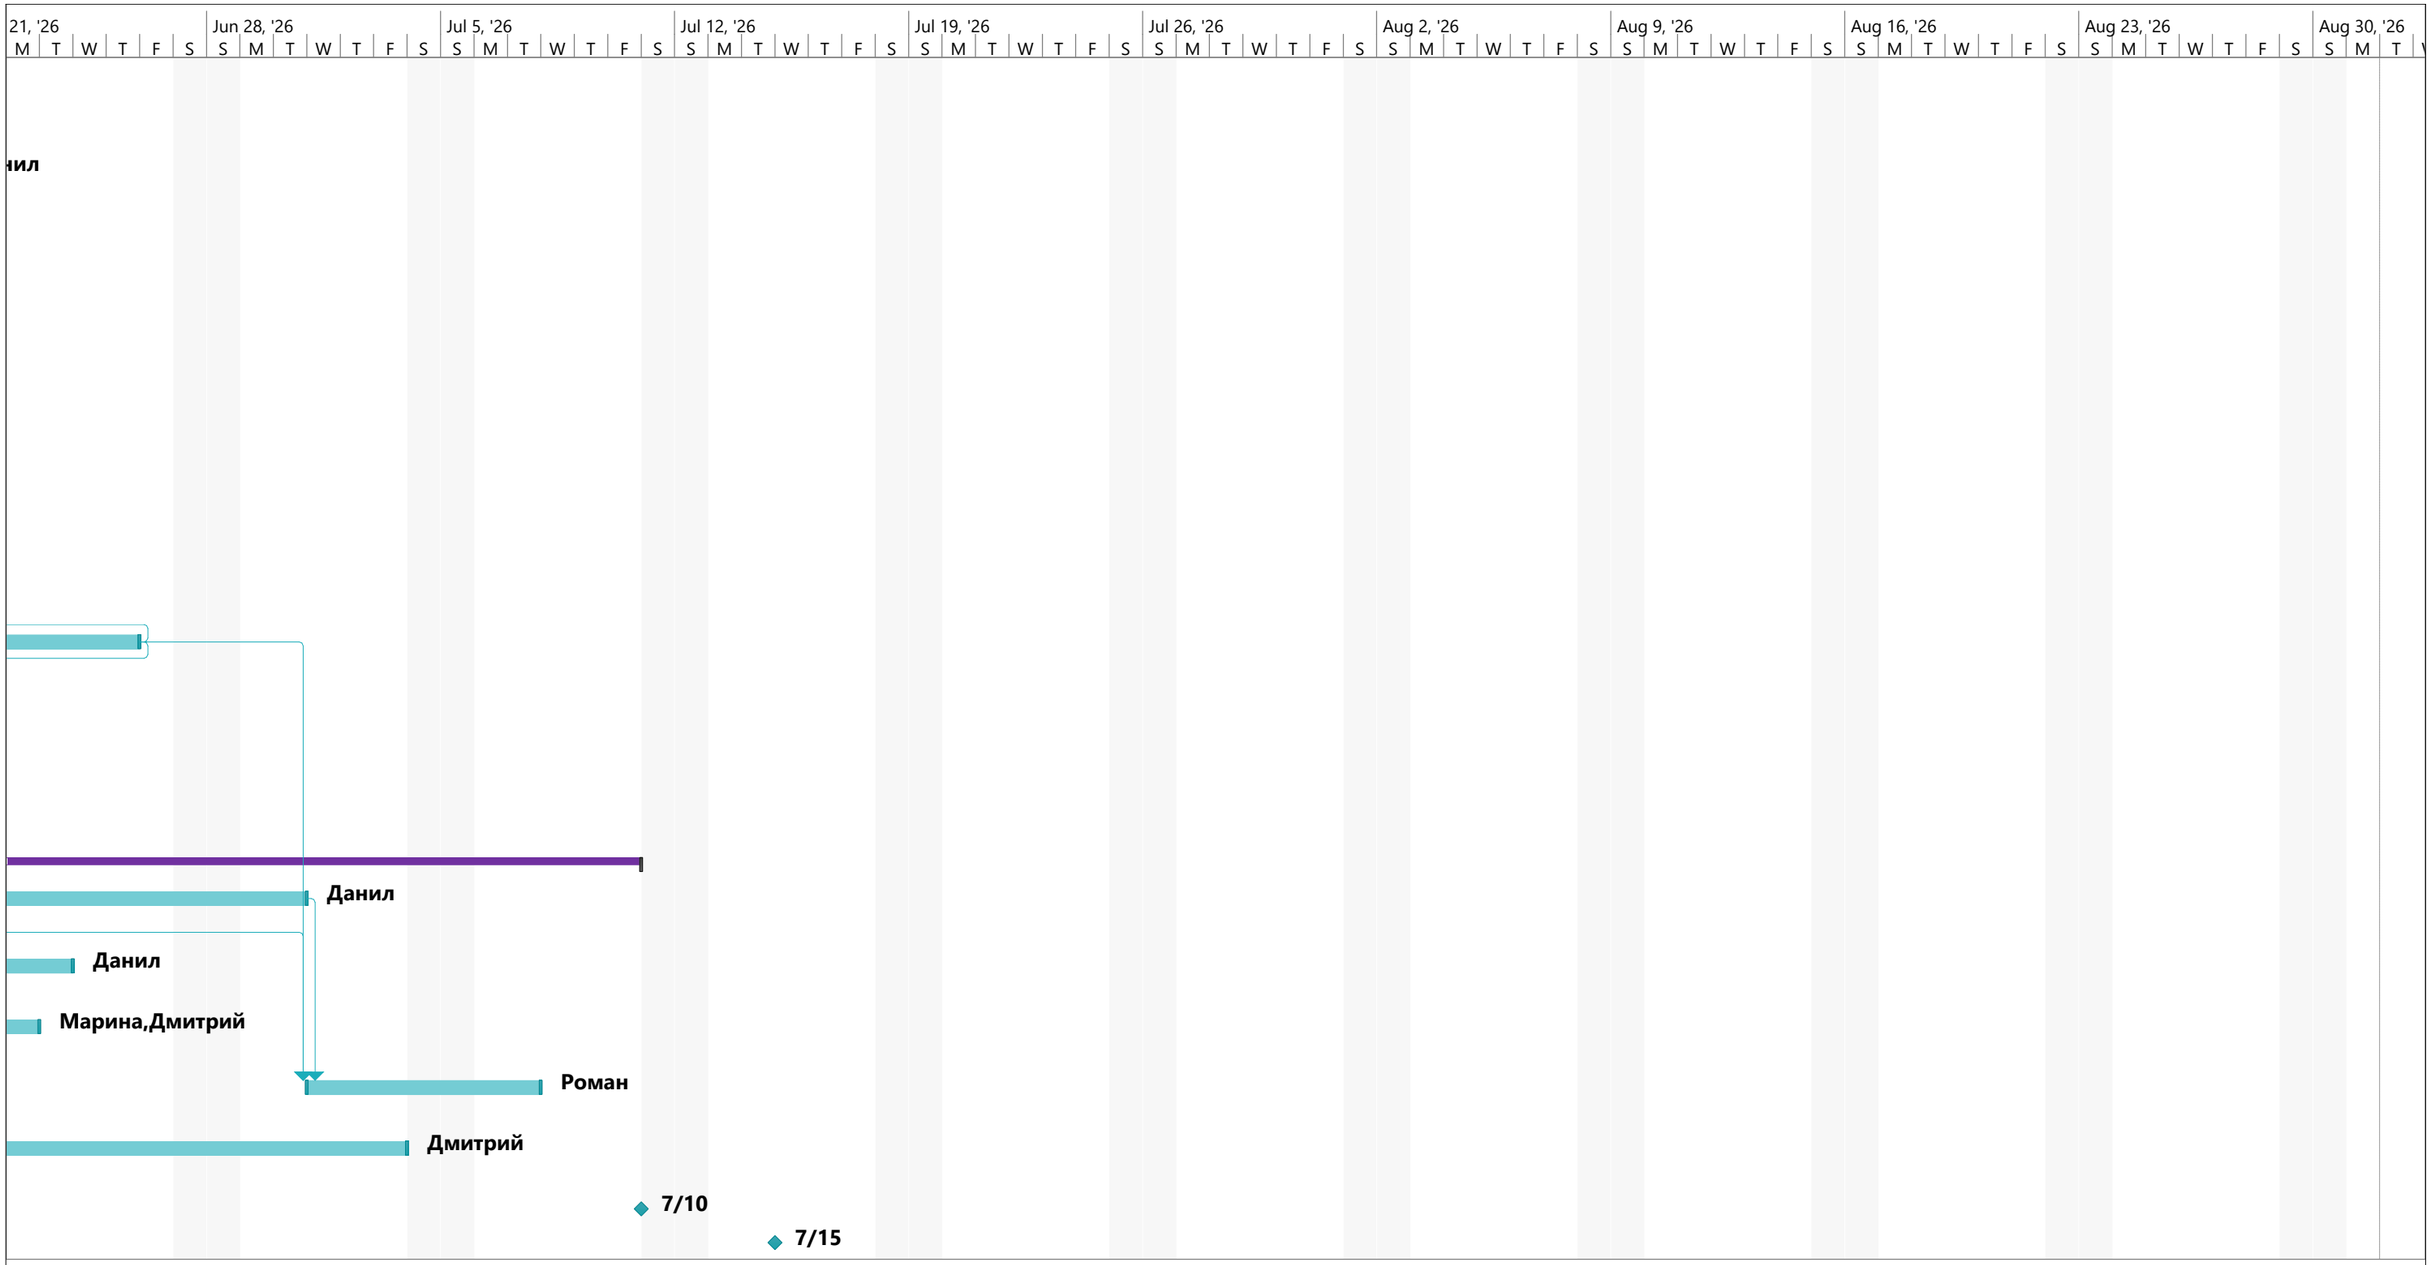

Project: Project1
Date: Fri 5/15/26

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			
